Slutprojekt – Teststrategi och planering

Case: MortgageFlow – nytt bolånesystem för NordFinance

Det här projektarbetet är kursens avslutande examination och ska testa studenternas förmåga att använda **hela testledningsprocessen från strategi till avslut**.

Projektet genomförs stegvis. Studenterna får alltså **inte all information från början**. Precis som i ett verkligt projekt förändras förutsättningarna under arbetets gång och de måste analysera konsekvenser, uppdatera sina planer och fatta nya beslut.

Projektet består av åtta delar:	**Inlämningsdatum**
Del 1 – Teststrategi	**20/10 12:00**
Del 2 – Testplan	**20/10 12:00**
Del 3 – Förändring och omplanering	**21/10 16:00**
Del 4 – Teststatus efter första testveckan	**22/10 16:00**
Del 5 – Underlag och rekommendation inför Go/No-Go	**23/10 16:00**
Del 6 – Testrapport	**27/10 12:00**
Del 7 – Presentation	**29/10 9-16**
Del 8 – Individuell Lessons Learned	**1/11 - 22:00**

Examinationens arbetssätt

Projektet genomförs **stegvis**.

Efter varje del lämnas resultatet in innan nästa scenarioinformation delas ut.

Det är viktigt eftersom studenterna ska visa att de kan:

> **planera → få ny information → analysera påverkan → uppdatera planen**

De ska alltså inte i efterhand skriva om historiken som om förändringen alltid varit känd.

Muntig presentation

Datum: 29 oktober

Tid: 30 minuter per grupp

Alla i gruppen måste prata. Ordningen för vem som börjar kommer att lottas ut

---

1. Projektets bakgrund

Banken **NordFinance** håller på att lansera ett nytt internt bolånesystem som heter **MortgageFlow**.

Systemet ska användas av bankens bolånehandläggare för att bland annat:

- ta emot bolåneansökningar
- kontrollera kunduppgifter
- genomföra kreditbedömningar
- hantera dokumentation
- godkänna eller avslå bolån
- kommunicera beslut till kunden.

Systemet är verksamhetskritiskt eftersom fel kan leda till bland annat ekonomiska förluster, felaktiga kreditbedömningar, säkerhetsproblem, GDPR-incidenter och kundmissnöje.

Ni arbetar som testteam och har fått uppdraget att **planera, leda, följa upp och avsluta testarbetet inför produktionssättning**.

---

2. Systemet

MortgageFlow har tre huvudsakliga användarroller.

Bolånehandläggare

Kan bland annat:

- skapa och hantera ärenden
- granska kunduppgifter
- se kreditbedömningar
- begära kompletteringar
- godkänna eller avslå ansökningar.

Senior handläggare

Kan bland annat:

- godkänna lån över 5 miljoner SEK
- överstyra vissa beslut
- se rapporter och statistik.

Administratör

Kan bland annat:

- hantera användare
- tilldela roller
- konfigurera systeminställningar.

---

3. Viktiga funktionella krav

Inloggning och säkerhet

Samtliga användare ska använda:

- användarnamn
- lösenord
- MFA

Efter fem felaktiga inloggningsförsök ska kontot låsas och administratör ska kunna låsa upp det. Systemet ska automatiskt logga ut användaren efter 10 minuters inaktivitet.

Registrering av bolåneansökan

En ansökan innehåller bland annat:

- personnummer
- namn
- kontaktuppgifter
- adress
- civilstånd
- årsinkomst
- anställningsform
- arbetsgivare
- önskat lånebelopp
- kontantinsats
- objektvärde.

Systemet ska bland annat validera personnummer, obligatoriska fält och inkomst samt kontrollera att lånebeloppet inte överstiger objektvärdet minus kontantinsatsen.

Ärendestatus

Ett ärende kan exempelvis vara:

> Ny → Under granskning → Komplettering krävs → Kreditkontroll pågår → Godkänd/Avslagen → Utbetald

Statusändringar ska loggas och endast behöriga roller får ändra status.

Kreditkontroll

MortgageFlow integrerar med en extern kreditupplysningstjänst och hämtar bland annat:

- kreditvärdighet
- betalningsanmärkningar
- skuldsaldo
- taxerad inkomst.

Systemet beräknar bland annat:

- skuldkvot
- belåningsgrad
- riskklass.

Exempel på affärsregler:

- skuldkvot över 6 → hög risk
- aktiva betalningsanmärkningar → hög risk och senior handläggare
- belåningsgrad över 85 % → varning
- instabil anställning kombinerat med låg inkomst → kompletterande dokumentation.

Stora lån

Lån över **5 miljoner SEK** kräver dubbelgodkännande:

1. bolånehandläggare
2. senior handläggare.

Dokument

MortgageFlow stödjer PDF, JPG och PNG, högst 10 MB per fil. Filer ska virusskannas, versionshanteras och uppladdningar loggas.

Beslut

Handläggaren kan:

- godkänna
- avslå
- begära komplettering


Avslagsorsak måste registreras och beslut ska loggas. Vid godkännande ska kunden automatiskt få e-postbekräftelse.

---

4. Icke-funktionella krav

MortgageFlow ska:

- svara inom **2 sekunder vid normal belastning**
- stödja minst **500 samtidiga användare**
- kryptera persondata
- logga vem som ändrat ett ärende och när
- säkerställa att användare endast ser ärenden enligt sin behörighet
- fungera i Chrome, Edge och Firefox.

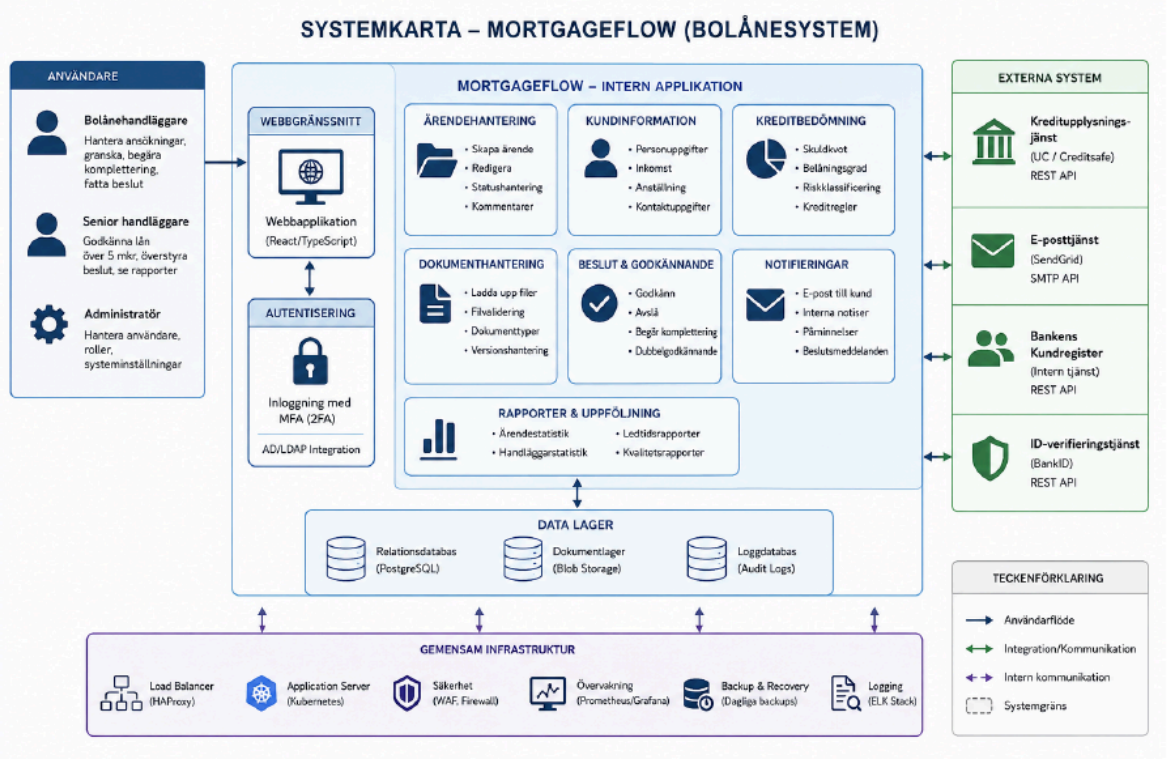

---

5. Ytterligare projektinformation

Följande information är **fiktiv projektinformation som lagts till för examinationen**.

Projektorganisation

Projektet består av:

- 1 projektledare
- 1 testledare
- 4 testare
- 3 utvecklingsteam
- Product Owner
- verksamhetsrepresentanter
- säkerhetsspecialist
- DevOps
- representant från kreditupplysningstjänsten

Testteam

Resurs	Kompetens
Testare A	API, integration, tekniska tester
Testare B	Funktionellt systemtest och E2E
Testare C	Bankverksamhet, UAT och testdata
Testare D	Regression, automation och behörighet

---

6. Projektets tidplan

Projektet har totalt **12 veckor kvar till produktionssättning**.

Planerad testperiod:

- vecka 1–2: testanalys och testdesign
- vecka 3: testdata och miljöförberedelser
- vecka 4–5: SIT
- vecka 5–8: systemtest
- vecka 8–9: UAT
- vecka 9–10: regression och retest
- vecka 11: Release Readiness
- vecka 12: Go/No-Go och produktionssättning

---

7. Testmiljöer

Projektet använder:

DEV → SYS → ACC → PROD

SYS används för:

- SIT
- systemtest
- API-test
- E2E
- regression
- retest

ACC används för verksamhetens acceptanstest.

---

8. Kända beroenden

MortgageFlow är bland annat beroende av:

- extern kreditupplysningstjänst
- kund-/personregister
- e-posttjänst
- MFA
- dokumentlagring
- databas
- autentisering
- nätverk och brandvägg
- testdata

DEL 1 – TESTSTRATEGI

Uppgift

Ta fram en **teststrategi för MortgageFlow** utifrån den teststrategimall som används i kursen.

Strategin ska visa hur ni övergripande avser att kvalitetssäkra systemet.

DEL 2 – TESTPLAN

Uppgift

Skapa en **Testplan version 1.0 för MortgageFlow** utifrån testplanmallen som används i kursen.

Planen ska vara så tydlig att en annan testledare skulle kunna förstå:

Vad ska testas, hur, när, av vem och under vilka förutsättningar?
